豊後大野市
橋梁長寿命化修繕計画

令和　６年　３月

豊後大野市　建設課

目　次

１．長寿命化修繕計画の目的

２．管理橋梁の現状と課題

３．長寿命化修繕計画の方針


1. 長寿命化修繕計画の目的

1.1 長寿命化修繕計画の目的


1.1.1　背景

本市が管理する橋梁は、令和5年度現在で587橋架設されています。このうち、建設後50年を経過する橋梁は全体の47%を占めており、20年後の令和25年には80%程度に増加します。

令和5年度
254 橋
（47%）

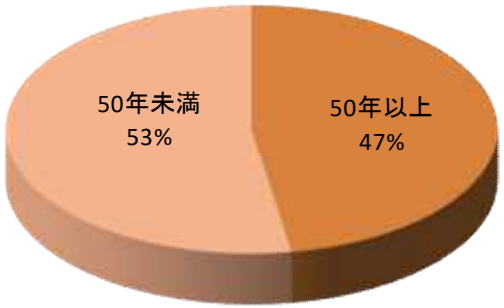

令和25年度
427 橋
（80%）

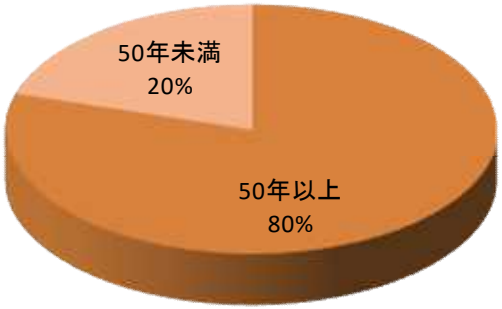

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念されます。

※対症療法型：橋梁が悪くなって補修を行う事後保全的維持管理法

1.1.2　目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、
限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取組みが
不可欠となります。


コスト縮減のためには、従来の**『対症療法型』**から、
“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”
⇒『予防保全型』
へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで豊後大野市では、
◆将来的な財政負担の低減
◆道路交通の安全性の確保
を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

2. 管理橋梁の現状と課題

2.1 現状

（１）橋梁の損傷割合（主部材）

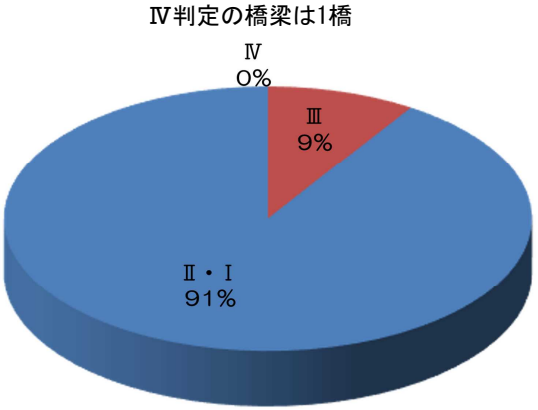

対策区分の判定区分


判定区分	対策区分	判　定　の　内　容
Ⅳ	E1	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある
	E2	その他、緊急対応の必要がある
Ⅲ	C2	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
	S1	詳細調査の必要がある。
Ⅱ	C1	予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
	B1	予防保全の観点から、状況に応じて補修を行う必要がある。
	M	維持工事で対応する必要がある。
	S2	追跡調査の必要がある。
Ⅰ	B0	状況に応じて補修を行う必要がある。
	A	損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要が無い。

早期対策が必要な評価区分

→ 主部材では9%（52橋）の橋梁は補修工事を急ぐ橋梁

（２）橋梁の損傷要因


損傷要因	橋梁数
経年劣化（中性化・かぶり不足等）	35
アルカリ骨材反応	12
洗堀	2
その他（無鉄筋）	1
その他	1

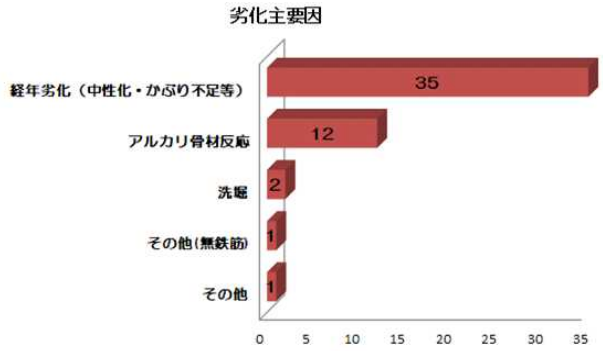

→ 劣化要因は経年劣化が多い

（３）橋長別橋梁数

50m以上	20m以上 ～ 50m未満	15m以上 ～ 20m未満	10m以上 ～ 15m未満	5m以上 ～ 10m未満	5m未満	全橋梁数
29	126	60	105	149	118	587

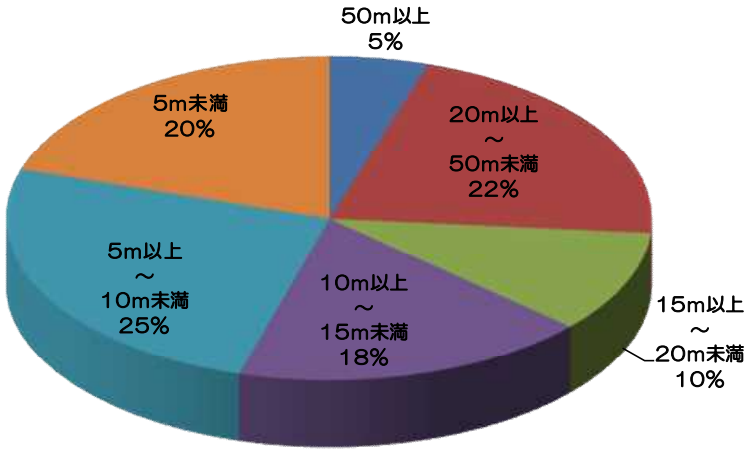


→ 管理橋梁のうち、約63%は15m未満の小規模橋梁

（４）主構材料別橋梁数

ＲＣ橋	ＰＣ橋	鋼橋	その他 (石橋,函渠)	全橋梁数
296	186	47	64	593


*1橋で主構材料が複数あるものは、それぞれの材料にカウントしている。

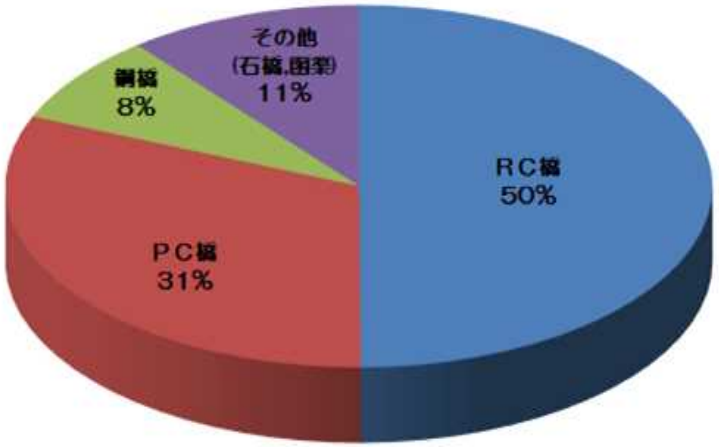

→ 管理橋梁のうち、約81%はコンクリート橋（PC・RC）

（５）道路種別別橋梁数


	橋数
1級市道	66
2級市道	119
その他の市道	402
合　計	587

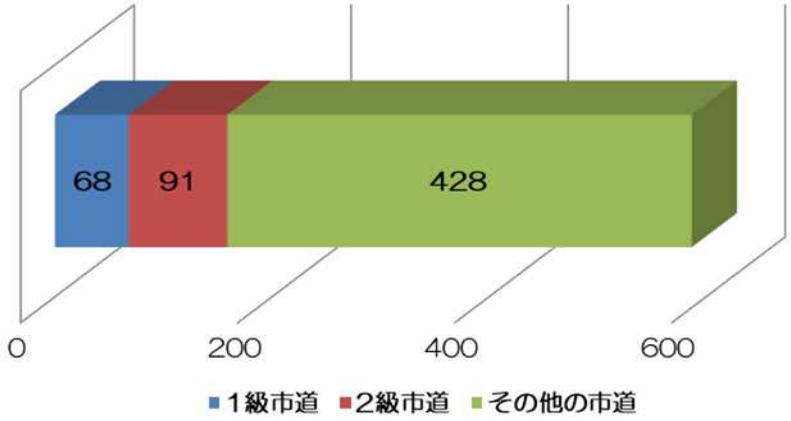

2.2 課題

現在で9%の橋梁が老朽化が原因により補修を急ぐ必要があります。
架設後50年を経過する橋梁が現在47%、10年後には約1.4倍の41%、
30年後には約1.9倍の91%と老朽化橋の割合は増加していきます。

図2.2 架設後50年経過橋梁の割合

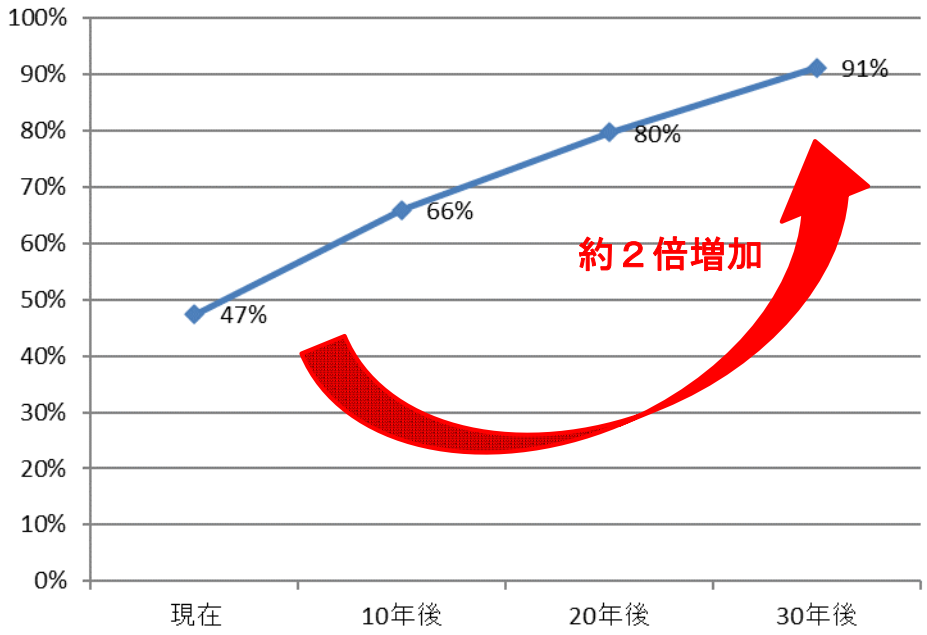

上記の課題に対し、予防保全へと転換をはかり、計画的な維持管理を行い、適切な点検、対策を行うことが必要です。

3. 長寿命化修繕計画の方針

3.1　基本方針

(1) 橋梁点検

安全・安心な交通の確保を図るため、定期的な橋梁点検を行います。

３ 定期点検の方法

定期点検は、近接目視により行うことを基本とする。

４ 定期点検の頻度

定期点検は、供用開始後２年以内に初回を行い、２回目以降は、５年に１回の頻度で行うことを基本とする。

『大分県橋梁定期点検要領（案）　令和元年11月』

※橋梁点検は『大分県橋梁定期点検要領（案）　令和元年11月』に準拠して行い、
点検結果は橋梁長寿命化修繕計画へ反映されます。

(2) 安全・安心の確保


生活基盤となる道路や橋梁の老朽化は、安全・安心な交通を損なうとともに道路ネットワークの維持も困難となります。

よって、計画的な維持管理に努め、安全・安心を確保します。


3.2　橋梁長寿命化修繕計画のながれ

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、損傷が顕在化する前に計画的に対策を行う予防保全型にて維持管理（5年のサイクル）を行うことで、橋梁寿命を供用後100年以上とし、橋梁の長寿命化を図り、今後の維持管理費の縮減を図るものとします。

維持管理のながれ

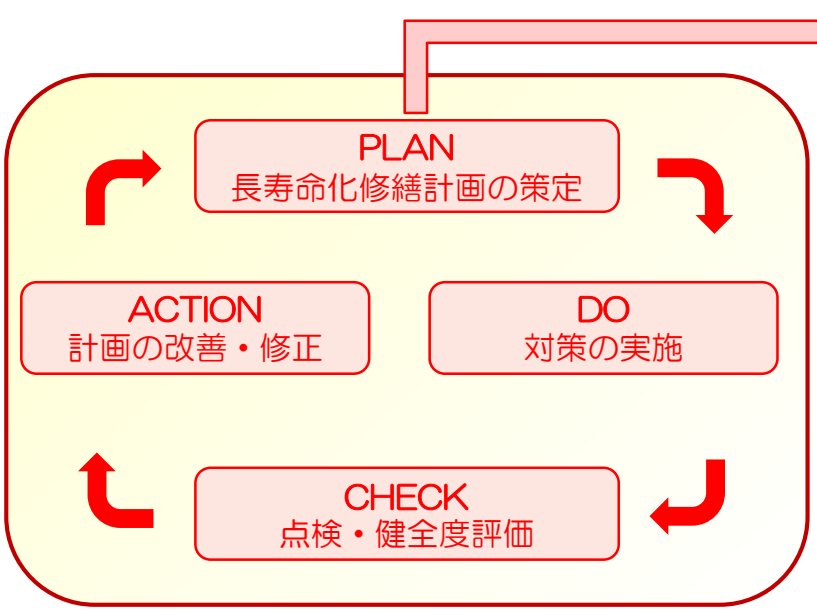

橋梁長寿命化修繕計画策定のながれ

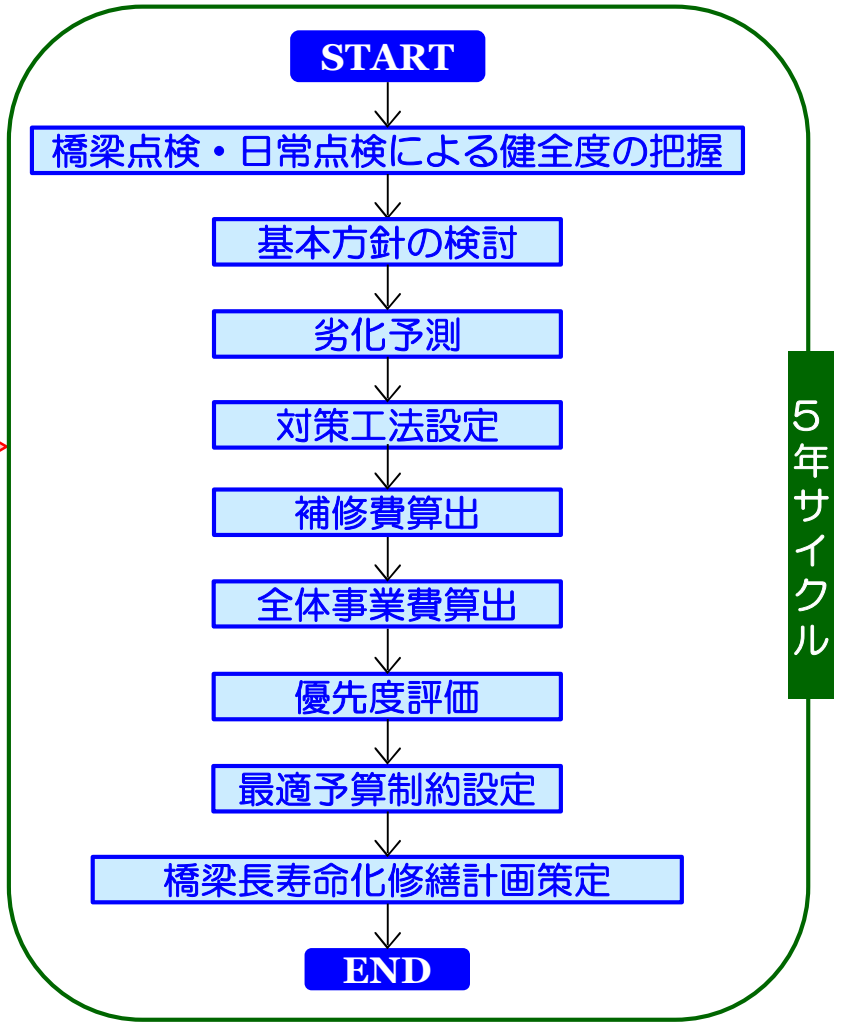

3.3　橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁

基本的には全ての橋梁を対象として予防保全型の長寿命化計画を策定します。
現在通行禁止橋梁、沈み橋については基本的に対症療法型の管理方法で対応します。


3.4　橋梁長寿命化修繕計画の効果

〇予防保全への転換により、橋梁の長寿命化を図ることができます。

〇修繕・架け替え時期の集中を回避でき、計画的な対策が出来るため、安心・安全な道路ネットワークを断続的に保持できます。

〇効率よく効果的な対策を行えるため維持管理コストの縮減を図ることが出来ます。

金額差　約350億円

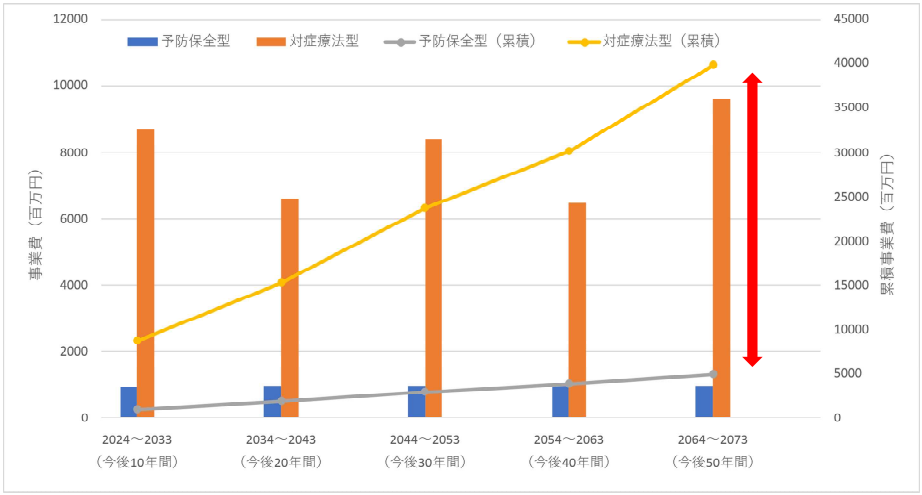

3.5　その他

集約化・撤去

点検の結果、判定区分Ⅲとなった５４橋のうち、迂回路が存在し集約が可能と考えられる１橋について、今後周辺状況や利用調査を基に、令和１０年度までの集約化・撤去を目指します。集約化・撤去を行う事で将来の維持管理費用を５百万円程度縮減することを目指します。

新技術の活用

定期点検に大型の橋梁点検車等が必要な３０橋程度の橋梁（橋長５０ｍ以上）に対し、新技術の活用を重点的に検討し、令和１０年度までに点検費用を５百万円程度縮減することを目指します。

対策に係る概算事業費

対策に係る概算事業費（Ｒ１０年度まで）については、約１０億円を想定しています。

3.6　学識経験者等に対する意見聴取

橋梁長寿命化修繕計画は、計画の妥当性確認の目的として、学識経験者の専門的な知識を有する者からの意見聴取が義務付けられています。

意見を聴取した学識経験者

独立行政法人　国立高等専門学校機構
大分工業高等専門学校　都市・環境工学科
教授　一宮　一夫　博士（工学）

計画策定担当部署

豊後大野市　建設課

3.7　改訂履歴

- **第1版**：H26.3月
- **第2版**：H31.3月
  R5.3月（一部改訂）
- **第3版**：R6.3月
  R7.10月（一部改訂）
  R7.12月（一部改訂）
  R8.10月（一部改訂）

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
1	緒方町	本谷橋	尾平上線	1963	15.4	3.6	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ							○								ひび割れ補修工等
2	緒方町	飯干橋	飯干線	1980	10.4	4.8	鋼	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
3	緒方町	飯干1号橋	飯干線	－	2.8	3.9	RC	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
4	緒方町	飯干2号橋	飯干線	－	2.4	4.4	RC	R1	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
5	緒方町	山ノ口橋	山ノ口線	1963	3.0	3.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
6	緒方町	奥土岩橋	奥土岩線	1982	13.4	4.2	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
7	緒方町	観音滝橋	豊栄線	1969	17.6	4.7	鋼	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
8	緒方町	豊栄2号橋	豊栄線	1969	15.5	4.7	鋼	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
9	緒方町	豊栄1号橋	豊栄線	1969	4.5	5.2	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
10	緒方町	豊栄3号橋	九折線	1971	8.5	4.7	鋼	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
11	緒方町	古川橋	九折線	1964	4.4	5.6	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
12	緒方町	権現橋	九折線	1960	22.5	5.2	鋼	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ							○			●		●			塗装塗替工等
13	緒方町	宮下橋	九折線	1951	9.3	4.1	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅲ							○							●	ひび割れ補修工等
14	三重町	植松橋	白谷久部線	1928	16.0	3.0	石橋	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ			○										
15	三重町	川津留橋	白谷中ノ津留線	1976	15.7	7.0	鋼	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
16	緒方町	辻浦橋	門線線	－	4.0	3.9	RC	R1	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
17	三重町	大内橋	白谷久部線	1973	27.0	4.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
18	緒方町	小河内橋	梅生線	1972	13.4	4.7	鋼	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ							○								塗装塗替工等
19	三重町	宮ノ下橋	宮ノ下線	1971	5.5	6.7	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
20	三重町	久部中央橋	梅津長小野線	1966	24.0	3.7	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ			○										
21	緒方町	門橋	滞迫湯ノ迫線	2014	3.0	13.4	BOX	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
22	三重町	谷川橋	梅津長小野線	1953	5.5	3.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
23	清川町	山神橋	伊毛線	1981	9.5	4.8	鋼	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
24	緒方町	犬返橋	犬返線	1926	28.9	4.4	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
25	三重町	障子岩橋	障子岩橋線	1916	24.1	3.9	石橋	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
26	緒方町	吉良橋	栗林上線	1981	4.0	6.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
27	緒方町	新紅葉橋	滞迫湯ノ迫線	1997	45.0	8.2	PC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
28	三重町	妙見橋	中津留中央線	1927	22.4	2.8	石橋	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
29	緒方町	烏帽子橋	小原湯ノ迫線	1951	20.7	3.9	RC	H28	Ⅲ	R2	Ⅲ							○							△	ひび割れ補修工等
30	三重町	毛内橋	毛内線	1978	10.1	3.5	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
31	三重町	中央橋	毛内線	1929	17.3	2.8	石橋	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
32	三重町	稲積橋	毛内線	1977	20.6	5.8	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
33	緒方町	山中橋	栗林上線	1981	5.0	8.1	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
34	清川町	伊毛2号橋	伊毛線	1962	5.4	4.5	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	○										○		
35	清川町	前橋	前線	1979	4.4	3.2	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅰ	R6	Ⅱ	○										○		

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
36	緒方町	年神橋	小原尾崎線	1989	8.4	4.8	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
37	清川町	伊毛橋	伊毛線	1962	3.6	4.0	RC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
38	清川町	柚木橋	近郷柚ノ木線	1979	4.4	3.3	RC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
39	緒方町	堂ノ内橋	小原中野線	1959	3.3	3.7	RC	R1	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
40	緒方町	天神橋	栗林上線	1952	4.0	4.3	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
41	緒方町	駄床橋	駄床１号線	1991	15.0	9.7	RC	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
42	緒方町	駄床橋	姥社湯ノ迫線	1961	12.6	4.8	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
43	緒方町	中村橋	三口榎津留線	1971	8.2	4.0	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
44	清川町	坂本橋	和毛線	1973	12.5	4.5	RC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
45	緒方町	鍛冶屋橋	鍛冶屋線	1999	16.4	5.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
46	緒方町	妙見橋	姥社湯ノ迫線	1953	55.6	3.9	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ							○					●		●	ひび割れ補修工等
47	清川町	御渡橋	近郷線	1979	6.2	4.5	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○										○		ひび割れ補修工等
48	緒方町	年ノ神橋	三口榎津留線	1942	13.1	4.0	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
49	緒方町	政所橋	上冬原大石線	1999	12.5	8.2	PC	H28	Ⅱ	－	－							○								
50	緒方町	小園橋	八屋線	1962	12.5	4.6	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
51	清川町	御岳橋	近郷線	1975	14.5	4.5	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
52	三重町	鹿毛３号橋	鹿毛線	1961	5.3	3.2	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
53	三重町	鹿毛２号橋	鹿毛線	1961	4.6	2.5	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
54	三重町	旧窟岩橋	福河内線	1926	21.4	3.8	石橋	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
55	三重町	窟岩２号橋	福河内線	1968	3.5	5.6	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
56	緒方町	八屋橋	八屋岩上線	1973	2.8	4.0	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
57	三重町	福河内橋	福河内線	1968	6.5	6.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
58	三重町	吹原2号橋	吹原線	1964	2.6	5.5	BOX	R1	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
59	三重町	鹿毛１号橋	鹿毛線	1961	5.0	3.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
60	三重町	吹原橋	吹原線	1963	2.5	4.3	BOX	－	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
61	三重町	本村橋	本村線	1967	6.0	4.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
62	緒方町	中野橋	牛ヶ迫横平線	2000	5.1	9.0	BOX	R1	Ⅲ	R3	Ⅰ							○								
63	清川町	轟橋	木落線	1932	68.9	4.7	石橋	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
64	三重町	小木浦橋	小木浦線	1991	14.2	8.6	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
65	三重町	熊ヶ谷橋	熊ヶ谷線	1961	18.5	4.0	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
66	清川町	藤田橋	近郷線	1971	11.5	5.0	RC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
67	緒方町	鶴田橋	森ノ下宮ノ谷線	1973	4.8	5.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
68	三重町	原の水橋	奥畑線	1980	45.9	5.2	鋼	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	塗装塗替工等
69	清川町	ホタル橋	犬鳴内平線	1985	19.0	4.6	鋼	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
70	緒方町	室の鶴橋	井上上冬原線	1995	12.7	8.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目		点検記録 2巡目		点検記録 3巡目		点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
														点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
71	緒方町	室ノ鶴橋	遠野姥社線	1973	7.0	3.9	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
72	緒方町	飛尾橋	仮宿岩上線	1955	10.1	3.3	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
73	緒方町	北向橋	北向線	1970	8.2	3.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
74	緒方町	山下橋	上冬原大石線	2002	100.0	7.7	PC	H28	Ⅱ	－	－							○								
75	緒方町	加賀知１号橋	加賀知線	2014	2.5	7.7	BOX	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
76	緒方町	上鶴橋	上冬原大石線	2002	103.0	7.7	PC	H28	Ⅱ	－	－							○								
77	緒方町	本久保橋	開拓３号線	1979	5.0	5.0	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
78	清川町	穴尾橋	柏宮線	1982	20.0	5.0	PC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
79	三重町	代橋	代線	1964	20.2	3.8	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
80	三重町	吹ノ下橋	土祝線	1967	5.4	5.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
81	三重町	山出橋	山出線	1975	4.1	3.5	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
82	三重町	荒谷橋	荒谷線	1981	25.0	5.0	鋼	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
83	三重町	柿ヶ津留橋	柿ヶ津留線	1970	18.3	2.4	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
84	緒方町	仮屋鶴橋	遠野徳田線	1919	8.6	3.9	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
85	三重町	轟橋	内平線	1928	38.7	3.3	石橋	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
86	緒方町	下河原橋	河原谷横平線	1964	4.5	5.3	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
87	三重町	片内橋	片内線	1964	5.8	4.9	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
88	清川町	内平第2号橋	内平本谷線	1962	4.7	3.8	RC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
89	緒方町	徳尾橋	徳尾４号線	－	4.5	4.3	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
90	緒方町	奥大無礼２号橋	奥大無礼線	1973	2.7	3.0	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ							○								
91	緒方町	徳田橋	仮宿岩上線	1957	12.0	3.6	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
92	緒方町	室橋	井上上冬原線	1997	4.0	7.9	BOX	R1	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
93	緒方町	新亀甲橋	米山馬背畑線	2023	15.8	7.0	PC	－	－	－	－							○								
94	緒方町	岩上橋	岩上線	1995	10.0	6.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
95	緒方町	みょうけん橋	立平柿木線	1985	15.4	5.6	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
96	緒方町	奥大無礼１号橋	奥大無礼線	1973	3.3	3.0	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
97	清川町	清水橋	清水線	1937	44.0	5.8	石橋	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
98	緒方町	鹿屋橋	鹿屋線	1964	6.2	4.2	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
99	三重町	黒田橋	土祝線	1967	8.0	3.8	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○										ひび割れ補修工等
100	緒方町	下尾尻橋	栩川線	1926	6.6	3.3	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
101	三重町	川平橋	板山線	1964	5.2	4.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
102	三重町	沓掛橋	仁田線	1980	4.3	3.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
103	緒方町	小豆穴橋	柿迫小豆穴線	1971	3.5	4.1	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
104	緒方町	監物橋	荒平姥社線	1997	12.3	8.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
105	清川町	岡橋	岡線	1979	3.5	3.0	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
106	三重町	板屋橋	板山線	1962	22.3	4.3	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	ひび割れ補修工等
107	緒方町	小迫花木沢１号橋	小迫花木沢線	1973	6.2	3.7	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
108	清川町	中津無礼橋	中津無礼合川線	1965	35.7	4.0	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅳ		Ⅳ		■		■		×					○		架替
109	三重町	板山１号橋	板山線	1973	6.6	4.1	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
110	三重町	増氏橋	田町線	1955	30.1	3.5	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	ひび割れ補修工等
111	清川町	丸小野橋	丸小野線	1960	5.3	3.0	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
112	緒方町	明正橋	尾尻線	1970	6.8	4.3	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
113	緒方町	大野橋	大野線	1975	15.0	4.8	鋼	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ							○							●	塗装塗替工等
114	緒方町	大広橋	徳尾線	1976	10.0	5.8	鋼	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ							○								
115	緒方町	平石橋	徳尾線	2003	11.6	8.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
116	清川町	納来橋	納来線	1973	9.4	3.1	RC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
117	三重町	板山２号橋	板山線	1966	5.5	4.2	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
118	三重町	坂本橋	坂本線	1954	5.0	3.4	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
119	緒方町	広井田橋	広井田小迫線	1952	19.6	2.5	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
120	三重町	板山４号橋	板山線	1966	4.4	3.7	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
121	三重町	板山３号橋	板山線	－	3.4	4.5	RC	－	－	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
122	清川町	柳橋	北津留線	1920	28.4	3.6	石橋	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
123	三重町	小中島橋	小中尾線	1977	6.2	3.7	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
124	緒方町	源橋	下徳田冬原線	1997	18.1	8.0	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
125	緒方町	蔵万寺橋	蔵万寺線	1976	15.0	4.8	鋼	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
126	緒方町	大馬橋	馬背畑平石線	1971	14.0	4.8	鋼	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
127	清川町	宮津橋	宮迫津留線	1961	2.5	4.6	RC	H26	Ⅱ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	○										○		
128	緒方町	六馬橋	馬背畑六種線	1933	24.7	3.7	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
129	緒方町	牧原十角２号橋	牧原十角線	1964	6.0	3.6	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
130	朝地町	小迫橋	小川野小迫線	1994	8.6	4.8	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
131	緒方町	牧原十角１号橋	牧原十角線	1964	8.5	4.7	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
132	緒方町	牧原橋	小富士幹線	1994	71.8	4.5	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
133	三重町	椎ノ木新橋	坂本線	2001	8.7	6.4	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
134	清川町	田ノ平橋	田ノ平線	1984	5.0	3.7	RC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
135	緒方町	枝石3号橋	牧原十角線	1950	11.2	3.8	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
136	緒方町	枝石橋	牧原十角線	1993	62.0	6.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
137	清川町	中宮橋	中宮線	1961	7.3	5.8	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	○												
138	緒方町	枝石2号橋	牧原十角線	1950	9.8	3.8	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
139	三重町	市ノ原橋	小津留線	1937	5.7	3.7	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
140	緒方町	枝石１号橋	牧原十角４号線	1950	9.7	3.8	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
141	緒方町	柚木寺原橋	赤川小富士線	1928	52.3	3.7	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
142	緒方町	天上橋	天上線	2000	21.0	8.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
143	三重町	並石橋	並石線	1965	5.0	3.4	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
144	清川町	宮迫陸橋	倉殿線	1988	21.0	4.2	PC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
145	清川町	中野橋	中野線	1961	2.4	6.7	RC	H26	Ⅲ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ	○										○		
146	緒方町	少名子橋	牧原十角４号線	1953	4.8	4.5	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
147	緒方町	寺山橋	牧原十角線	1964	12.4	6.0	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
148	三重町	白岩橋	宝河内線	1971	3.0	3.3	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
149	緒方町	浦ノ谷橋	寺原線	1945	6.5	3.6	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
150	清川町	岩上橋	岩上線	1981	67.0	6.0	PC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
151	清川町	柳瀬橋	伏野新田線	1964	27.0	4.4	PC	H26	Ⅱ	R1	Ⅲ		Ⅲ	○										○		架替
152	三重町	赤道橋	赤道梅ノ木線	1961	5.2	4.1	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○										ひび割れ補修工等
153	三重町	下園橋	下園線	1973	6.2	4.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
154	緒方町	上ノ原（平野）橋	馬背畑上の原線	1991	18.4	5.0	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
155	緒方町	上年野橋	辻上年野線	1921	12.0	3.6	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
156	清川町	京田橋	京田線	1989	19.0	4.6	鋼	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
157	清川町	紺屋橋	紺屋線	1979	2.5	4.9	RC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
158	三重町	下鷲谷橋	下鷲谷線	1968	21.1	3.6	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	ひび割れ補修工等
159	緒方町	なが瀬橋	辻上年野線	1921	78.4	4.0	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
160	緒方町	七杖橋	宮尾線	1991	11.0	6.7	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
161	三重町	鴨ヶ畑橋	鴨ヶ畑線	1975	12.7	4.7	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ			○										
162	三重町	久原陸橋	久原本村線	1980	29.0	5.2	鋼	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○						●		●		塗装塗替工等
163	三重町	山角橋	鴨ヶ畑線	1965	6.0	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
164	三重町	線道橋	下線道線	1990	11.5	7.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
165	緒方町	六口橋	佃原六口線	1936	16.4	3.1	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
166	三重町	山ノ神橋	和下線	1965	17.1	4.3	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	ひび割れ補修工等
167	三重町	旧馬場橋	馬場線	1973	10.1	5.2	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
168	緒方町	山田橋	小野今山線	1979	8.5	4.8	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
169	緒方町	辻渡橋	辻川入線	1954	6.0	4.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
170	緒方町	みどり橋	宮尾線	1961	6.0	4.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
171	三重町	観音橋	久知良松谷線	1982	6.7	6.3	石橋	H27	Ⅰ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
172	緒方町	桑原橋	佃原片峯線	1993	24.7	5.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
173	三重町	庵の園橋	久知良松谷線	2011	17.6	10.3	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
174	緒方町	新川入橋	川入桑津留線	2001	15.0	6.5	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
175	緒方町	高尾橋	小宛中央線	1973	3.6	3.8	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
176	緒方町	川入橋	川入桑津留線	1929	4.4	4.7	石橋＋RC	H26	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
177	三重町	岩下２号橋	塚田線	1973	5.7	5.2	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
178	三重町	岩ノ下橋	塚田線	1969	24.0	4.7	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
179	緒方町	ヒシゴ橋	緒方中央線	1914	5.5	8.2	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
180	緒方町	河宇田橋	知田茶屋場線	1990	19.0	6.2	PC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
181	三重町	中西橋	中西線	1959	3.6	3.7	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
182	緒方町	柿田橋	柿田線	1971	4.4	5.6	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
183	緒方町	倉園橋	柿田線	1971	3.0	9.6	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
184	三重町	中村橋	中西線	2010	2.0	14.7	BOX	H27	Ⅰ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
185	三重町	内山橋	久知良谷線線	2010	23.3	10.3	PC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
186	緒方町	拝殿原橋	知田朷迫線	1935	10.5	1.8	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
187	緒方町	原尻橋	倉園宮線線	1923	73.5	3.9	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
188	緒方町	小宛中央１号橋	小宛中線線	1973	4.5	3.4	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ							○								ひび割れ補修工等
189	三重町	河原橋	高寺中央線	1955	3.9	3.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
190	緒方町	大畑橋	大畑線	1973	8.9	3.1	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
191	緒方町	川久保橋	知田茶屋場線	1919	11.0	3.7	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
192	緒方町	新赤竹橋	小園片峯線	2003	26.6	6.4	PC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
193	緒方町	あかたけ橋	小園峯線線	1935	18.1	4.1	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
194	清川町	井崎橋	井崎線	1979	35.0	4.8	鋼	H26	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	Ⅲ	○					△		●		●	○		塗装塗替工等
195	三重町	山田橋	玉田高寺線	1959	8.0	4.5	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
196	緒方町	原尻滝４号橋	原尻線線	1978	5.0	6.5	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
197	緒方町	原尻滝３号橋	原尻線線	1978	7.3	6.5	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
198	緒方町	鮒川橋	荒平姥社線	2001	14.7	11.3	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
199	緒方町	入田橋	井上田線線	2005	28.8	3.4	PC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
200	三重町	久鬼橋	内田鬼塚線	2000	22.0	8.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
201	三重町	小屋園橋	小屋園線	1989	21.5	5.0	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
202	緒方町	原尻滝2号橋	原尻滝線	1978	13.0	6.5	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○								
203	緒方町	不動橋	井上上冬原線	1988	85.3	8.8	PC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
204	緒方町	原尻滝１号橋	原尻線線	1978	3.5	7.1	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
205	緒方町	野仲橋	知田原線線	1979	7.6	5.8	石橋	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
206	三重町	小屋園２号橋	小屋園線	1973	4.0	4.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
207	緒方町	清流橋	荒平姥社線	1998	14.5	12.1	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
208	緒方町	石用２号橋	石用線	1973	6.6	4.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
209	緒方町	鳴滝橋	知田中央線	1922	52.7	4.3	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
210	緒方町	石用１号橋	石用線	1973	4.2	8.9	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
211	清川町	ウソノヲ橋	ウソノヲ線	1985	35.0	4.0	PC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○		
212	緒方町	間戸橋	間戸柄々２号線	2013	6.6	3.8	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
213	緒方町	新間戸橋	間戸柄々線	1994	9.8	7.0	PC	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ							○								
214	緒方町	大久保年野１号橋	大久保年野線	1981	3.5	8.8	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
215	緒方町	馬場知田2号橋	馬場知田線	－	2.3	8.1	BOX	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
216	緒方町	東仙寺橋	馬場知田線	1994	36.0	3.6	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
217	三重町	羽飛橋	山中線	1973	8.1	5.2	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
218	三重町	堤橋	久知良内田線	1980	7.5	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
219	三重町	高屋２号橋	高屋石場線	－	4.0	5.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
220	緒方町	馬場3号橋	緒方中央線	－	1.8	6.4	BOX	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
221	緒方町	井上跨線橋	鼓田井上線	2002	18.0	8.2	PC	H25	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
222	緒方町	馬場2号橋	緒方中央線	－	1.7	5.5	RC	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
223	三重町	高屋4号橋	高屋石場線	－	5.0	4.5	BOX	R1	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○	△									ひび割れ補修工等
224	緒方町	三郎橋	三郎橋線	1929	20.0	3.3	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
225	三重町	高屋１号橋	高屋石場線	－	4.6	5.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
226	三重町	高屋3号橋	高屋・石場線	－	10.0	4.8	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
227	緒方町	新緒方橋	役場線	1998	54.0	20.0	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
228	緒方町	大石橋	役場線	－	3.6	14.9	BOX	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
229	緒方町	三郎大橋	荒平姥社線	1998	68.9	15.0	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
230	三重町	久知良橋	久知良内田線	2000	24.0	6.2	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
231	緒方町	馬場1号橋	緒方中央線	－	4.0	21.3	BOX	R1	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
232	緒方町	緒方橋	馬場小野線	1973	46.0	6.1	石橋	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
233	三重町	津留田２号橋	久知良内田線	1980	7.4	5.5	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ			○										
234	緒方町	小柳橋	小柳線	1968	3.8	6.4	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
235	緒方町	鉢ノ久保橋	馬場小野線	1981	5.1	7.7	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
236	緒方町	馬場知田１号橋	馬場知田線	1973	4.0	4.7	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ							○								
237	三重町	鹿嶋橋	高屋線	1995	14.5	5.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
238	緒方町	樋口橋	火の口線	1958	3.3	9.1	RC	H27	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
239	緒方町	園田橋	園田嶋線	1976	4.2	4.4	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○								
240	三重町	赤金橋	肝煎鬼塚線	1982	10.5	3.6	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
241	三重町	高屋橋	高屋線	2001	16.0	6.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
242	緒方町	野尻橋	緒方中央線	1961	8.5	7.3	PC	－	Ⅰ	R3	Ⅱ							○								
243	三重町	奥内田橋	久知良内田線	1973	3.0	3.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
244	三重町	竹ノ上橋	高屋線	1962	6.5	5.3	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
245	三重町	津留田橋	赤嶺舟戸線	1984	31.0	6.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
246	三重町	後山田橋	山田角門線	1958	4.4	4.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	I			○									
247	緒方町	三郎１号橋	三郎橋線	1975	3.4	4.4	RC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○							
248	清川町	天神橋	古道春日線	1962	5.0	7.8	RC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○	
249	三重町	重政第2跨道橋	久知良内田線	2016	14.1	5.0	PC	－	－	R3	Ⅰ	R7	I			○									
250	緒方町	広町２号橋	広町線	1975	4.0	4.4	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○							
251	緒方町	下市２号橋	下市線	1978	4.8	4.4	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○							
252	緒方町	丸山橋	丸山線	1984	3.9	5.2	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○							
253	緒方町	大久保跨道橋	大久保年野線	1990	27.5	6.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○							
254	緒方町	広町１号橋	広町線	1975	3.0	4.4	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○							
255	緒方町	下市１号橋	下市線	1973	4.6	4.5	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○							
256	緒方町	本田桑原１号橋	本田桑原線	1973	3.2	2.5	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅰ							○							
257	三重町	長谷橋	山田角門線	1958	7.0	4.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ			○	●								ひび割れ補修工等
258	三重町	瀬戸橋	高屋線	1997	19.2	6.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
259	緒方町	松山１号橋	松山線	1976	5.3	17.8	RC	H26	Ⅲ	R3	Ⅱ							○							
260	緒方町	辻橋	下自在辻線	1990	3.4	11.5	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○							
261	三重町	奥内田橋	内田鬼塚線	2003	15.3	8.8	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
262	三重町	玉田橋	市場玉田線	1982	18.2	6.7	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
263	三重町	重政第1跨道橋	重政地蔵原線	2015	14.1	5.0	PC	－	－	R2	Ⅰ	R7	I			○									
264	三重町	横田橋	黒枝下ノ田線	1973	6.0	5.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
265	三重町	大門瀬橋	高屋線	1962	25.2	4.8	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									ひび割れ補修工等
266	清川町	柏原橋	駅前野尻線	1965	10.0	4.5	RC	H26	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○	
267	緒方町	上枝橋	上枝１号線	1973	3.5	9.2	PC	H28	Ⅰ	R3	Ⅰ							○							
268	緒方町	今宮１号橋	今宮線	1973	3.6	3.0	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ							○							
269	清川町	鉢山橋	柿木鉢山線	1951	9.0	7.1	RC	H26	Ⅰ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ	○										○	
270	三重町	古坊橋	古坊線	1988	12.0	6.0	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
271	三重町	新嶋田橋	嶋田河津留線	1981	35.0	5.7	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
272	三重町	広瀬橋	上小坂広瀬線	1995	17.2	6.2	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									ひび割れ補修工等
273	緒方町	軸丸南橋	軸丸南線	1961	3.9	5.8	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○							
274	緒方町	牧橋	野尻線	1931	62.3	6.2	RC	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ							○							ひび割れ補修工等
275	三重町	平吹橋	平吹線	1976	29.0	14.8	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
276	三重町	郡田橋	赤嶺舟戸線	2005	49.5	11.3	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
277	三重町	重政橋	重政線	1940	4.2	4.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	I			○									
278	三重町	下中田橋	重政線	1978	28.6	4.5	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○	●								ひび割れ補修工等
279	三重町	天神橋	上小坂広瀬線	1963	21.0	4.8	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									
280	三重町	重政大橋	重政停車場線	1971	27.0	12.7	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○									

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
281	緒方町	平治畑２号橋	平治畑線	1973	2.6	3.7	RC	H28	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
282	緒方町	中学校宇土1号橋	中学校宇土線	－	3.2	10.5	BOX	R1	Ⅱ	R3	Ⅰ							○								
283	緒方町	天神橋	中学校宇土線	1986	90.0	7.4	PC	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ							○								
284	三重町	下赤嶺橋	原田権現堂線	1986	47.5	6.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
285	三重町	高太郎橋	高太郎線	1976	28.6	4.0	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅰ			○										
286	大野町	夏足大橋	鼓田井上線	2006	242.0	9.5	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
287	三重町	観音橋	下玉田市原線	1982	19.7	5.0	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	ひび割れ補修工等
288	大野町	たちんだ橋	徳尾線	－	11.4	4.1	石橋	H29	Ⅲ	R4	Ⅰ									○						
289	三重町	御手水橋	御手水中ノ原線	1971	21.2	8.8	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
290	三重町	下田橋	上赤嶺線	1966	17.0	6.2	鋼	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ		●	○										塗装塗替工等
291	三重町	志もた橋	上赤嶺線	1962	12.5	6.3	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
292	三重町	世原橋	世原線	1963	6.1	3.5	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
293	三重町	下の前橋	上小坂中小坂線	－	9.9	4.8	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
294	三重町	小坂橋	下赤嶺入北線	2008	166.0	7.7	PC	－	－	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
295	大野町	沈堕橋	夏足線	1987	40.2	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
296	三重町	川辺陸橋	川辺線	1984	10.9	5.4	BOX	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
297	三重町	榎ノ口橋	上小坂中小坂線	2012	35.0	8.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
298	三重町	平橋	川辺中央線	2010	2.7	8.7	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
299	三重町	下ノ前橋	下赤嶺入北線	2007	49.1	8.2	RC	－	－	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
300	三重町	篠場橋	篠場線	1980	4.2	3.9	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
301	三重町	山ノ口３号橋	山ノ口線	1964	7.0	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
302	三重町	山ノ口2号橋	山ノ口線	1963	11.2	4.7	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
303	朝地町	小野田橋	普光寺小野線	1999	10.8	6.8	RC	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
304	三重町	山ノ口１号橋	山ノ口線	1962	7.0	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
305	朝地町	用作橋	用作善光寺線	－	6.5	4.1	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
306	三重町	鶴手石橋	上小坂入北線	1975	13.1	6.6	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ			○										
307	三重町	川津留橋	上小坂入北線	1976	15.7	7.0	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
308	三重町	真名渡橋	下赤嶺入北線	2009	12.0	8.2	PC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
309	三重町	真名渡３号橋	下赤嶺入北線	2009	11.0	8.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
310	三重町	大久保橋	大久保線	1960	5.2	3.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
311	三重町	黒岩橋	百枝線	1971	4.2	4.5	RC	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
312	三重町	真名渡２号橋	下赤嶺入北線	2009	8.5	8.2	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
313	朝地町	坪泉跨道橋	嶋先三本松線	2016	45.0	6.0	PC	H28	Ⅰ	R4	Ⅰ									○						
314	大野町	矢田橋	沈田矢田線	1936	3.7	6.0	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
315	大野町	矢田橋	牛首線	1991	23.0	8.4	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
316	三重町	柿ノ木平橋	柿ノ木平線	1973	4.6	4.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
317	三重町	百枝橋	百枝中央線	1975	4.6	4.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
318	大野町	平井川大橋	鼓田井上線	2005	217.0	9.5	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
319	三重町	斗代橋	斗代線	1981	5.4	4.3	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
320	三重町	尾崎橋	芦刈中央線	1980	8.7	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
321	三重町	山渡橋	上小坂入北線	1976	37.5	8.0	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ			○										
322	三重町	牟礼橋	鍵線	2022	47.3	5.0	PC	－	－	－	－	R7	Ⅰ			○										
323	三重町	下町橋	下町線	1978	5.3	4.3	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
324	三重町	久毛渕橋	上小坂入北線	1975	9.6	6.6	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
325	朝地町	宮生１号橋	宮生線	2003	59.6	8.7	PC	H27	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
326	朝地町	宮田橋	横松松尾線	－	4.9	4.8	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
327	朝地町	桐木橋	桐木線	2010	46.8	4.0	PC	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
328	三重町	芦刈橋	杉崎金田線	－	2.5	5.0	BOX	－	－	－	－	R7	Ⅰ			○										
329	朝地町	大坪橋	大坪線	1953	21.7	2.5	石橋	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ									○						
330	三重町	一ノ谷橋	一ノ谷線	1937	4.1	3.5	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
331	大野町	第三矢射渡橋	矢射渡線	1973	7.8	4.0	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
332	大野町	第二矢射渡橋	矢射渡線	－	5.9	4.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
333	三重町	舟場橋	舟場線	1930	5.2	4.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
334	三重町	屋応路橋	金田三重ノ原線	1981	9.6	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
335	朝地町	中渡橋	堀家幹線	1997	20.4	8.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ									○	△		●		●	ひび割れ補修工等
336	三重町	麻生橋	山ノ口線	1958	18.2	3.5	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
337	朝地町	大恩寺陸橋	高伏線	1970	20.5	3.7	鋼	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ						●			○						塗装塗替工等
338	三重町	受川橋	大手木線	1953	25.0	3.1	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ			○	●									ひび割れ補修工等
339	朝地町	一ツ橋	追分線	1930	15.6	6.6	RC	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ								●	○	●					ひび割れ補修工等
340	朝地町	一ツ樋橋	樋の口線	1984	18.0	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
341	朝地町	北泉橋	鳴崎三本松線	2002	16.1	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
342	朝地町	中江橋	中江線	1995	20.7	5.7	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
343	三重町	樋掛橋	上田原中原線	1978	7.8	4.6	RC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
344	三重町	又井橋	芦刈又井線	1981	7.3	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
345	三重町	太田橋	亀ノ甲線	1956	10.0	4.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
346	大野町	舟久手橋	舟久手線	1995	14.0	5.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
347	朝地町	田村橋	平井田村線	－	8.0	5.3	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
348	朝地町	折立橋	折立線	－	7.3	3.6	RC	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ									○			●		●	ひび割れ補修工等
349	朝地町	和田鶴橋	畏原宮生浦線	1969	33.0	4.3	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ									○						ひび割れ補修工等
350	朝地町	新鼓橋	宮生線	2008	46.0	5.2	PC	H27	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
351	朝地町	鼓橋	宮生線	1970	39.1	4.3	PC	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
352	大野町	二千年大橋	鼓田井上線	2000	131.0	9.5	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
353	朝地町	二ツ橋	追分線	2015	21.3	6.2	PC	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
354	三重町	亀ノ甲橋	亀ノ甲線	－	7.5	3.8	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
355	大野町	中駒橋	駒方中原線	2012	19.5	6.2	PC	H27	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
356	三重町	辻橋	辻下津留線	1978	3.5	4.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
357	朝地町	橋ヶ坪橋	野間線	1972	10.4	5.3	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
358	三重町	上田原橋	赤嶺小田原線	2014	2.8	8.2	RC	H26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
359	朝地町	新吐合橋	吐合線	－	13.4	8.5	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
360	三重町	虹澗橋	柳井瀬2号線	1824	31.0	6.1	石橋	H27	Ⅰ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
361	三重町	尾清水橋	柳井瀬２号線	1961	5.0	4.4	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
362	大野町	平釘橋	平釘線	1973	3.6	4.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
363	朝地町	松の木橋	松の木線	1962	12.2	3.3	RC	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
364	朝地町	市万田橋	市万田支庫線	1925	21.2	4.6	石橋＋RC	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
365	三重町	菅生大橋	赤嶺金田菅尾線	1977	7.0	6.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
366	三重町	前田橋	森迫前田線	1981	8.1	4.1	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
367	大野町	小原橋	小原線	1987	25.8	7.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
368	千歳町	西迫橋	西迫線	1974	3.9	4.3	RC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
369	朝地町	長谷橋	長谷線	1969	8.5	6.8	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
370	大野町	横井下橋	横井線支線	2017	5.6	3.0	RC	－	－	R4	Ⅰ									○						
371	三重町	菅生橋	菅尾停車場線	1977	10.6	7.7	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
372	朝地町	池田橋	北部幹線	1981	19.7	6.4	PC	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ									○			●		●	ひび割れ補修工等
373	三重町	平原橋	平原線	1973	2.5	3.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅰ			○										
374	朝地町	吐合橋	県道朝地直入線	1964	5.0	7.1	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
375	大野町	出合橋	牛首線	1932	18.7	4.0	RC	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ									○					●	ひび割れ補修工等
376	三重町	野間橋	森迫菅尾線	1956	7.1	3.8	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○										ひび割れ補修工等
377	三重町	浅水1号橋	菅尾団地線	1983	10.0	4.6	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
378	朝地町	徳の原橋	長谷線	1968	9.5	6.8	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
379	朝地町	篠原橋	篠原線	1969	12.6	4.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
380	千歳町	川崎橋	原田1号線	1998	17.7	8.2	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
381	千歳町	下津留橋	中原線	1975	10.0	4.8	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
382	三重町	菅生団地橋	菅尾団地線	1973	5.5	6.3	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ			○										
383	大野町	小鳥橋	小鳥線	2012	18.3	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
384	朝地町	新松の木橋	松の木支線	1991	21.5	5.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
385	千歳町	福生寺橋	福生寺線	2000	11.8	8.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
386	三重町	木の崎橋	木ノ崎線	1961	5.0	3.0	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
387	朝地町	高橋	三宅山線	1975	10.5	4.1	RC	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ									○	●		●			ひび割れ補修工等
388	千歳町	甲斐氏橋	甲斐氏線	1975	12.0	4.7	鋼	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
389	三重町	不思議橋	宇対瀬線	1972	6.5	7.6	RC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
390	大野町	堤田橋	鼓田・上津線	－	4.9	8.2	BOX	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
391	大野町	鼓田橋	鼓田・上津線	1986	18.5	8.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
392	朝地町	瀬口橋	瀬口線	1972	16.0	5.3	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ						△			○						塗装塗替工等
393	大野町	祇園橋	岩崎・横井線	1973	17.3	8.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
394	千歳町	妙戸木橋	倉波1号線	1975	12.1	4.8	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
395	千歳町	第1前田橋	長田岩下線	1973	9.6	6.2	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
396	大野町	常忠寺橋	山下常忠寺線	1973	4.0	4.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
397	千歳町	脇ノ田橋	倉波2号線	1973	13.5	7.1	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
398	大野町	代三五橋	下山片島線	1994	8.2	8.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
399	千歳町	川向橋	川向線	1975	12.0	4.7	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
400	千歳町	徳林橋	倉波３号線	1999	6.8	3.3	RC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
401	朝地町	池在橋	池在線	1924	20.8	3.6	石橋	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
402	朝地町	神砥石橋	神砥石線	2020	9.0	5.7	RC	－	－	R4	Ⅰ									○						
403	大野町	広鏡橋	鏡線	1992	9.7	5.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
404	大野町	神松橋	神松線	1986	14.9	8.7	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
405	大野町	桑迫橋	桑迫線	1973	1.9	6.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
406	千歳町	清戸橋	大木田尾線	1973	9.5	6.7	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
407	朝地町	草深橋	草深線	1991	6.0	3.5	RC	R1	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
408	千歳町	田平浦橋	田尾真萱線	1977	3.8	4.3	RC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
409	千歳町	野間橋	田尾真萱線	1979	3.0	4.3	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
410	三重町	宮尾中央橋	宮尾中央線	1984	13.0	5.0	PC	H27	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ			○									●	ひび割れ補修工等
411	千歳町	尾刎橋	田原園２号線	1979	4.1	4.3	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
412	千歳町	田尾橋	田原園４号線	1979	3.5	4.3	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
413	大野町	加原橋	住吉直北線	1957	7.0	3.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
414	大野町	桑原跨道橋	土家・代間線	2014	87.2	5.0	PC	－	－	R4	Ⅱ									○						
415	大野町	中道橋	中原・河屋線	2006	46.4	8.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
416	大野町	妙見橋	向原線	1992	8.9	5.1	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
417	大野町	加原跨道橋	加原線	2014	20.2	5.0	PC	－	－	R4	Ⅱ									○						
418	大野町	平成なかむら橋	向原線	1992	7.5	5.6	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
419	千歳町	平川橋	高畑細長線	2002	10.7	9.8	PC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
420	三重町	平成大橋	宇対瀬柴山線-岩下2号線	1989	210.0	9.8	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
421	千歳町	清田橋	田原園1号線	2002	60.0	6.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
422	大野町	鹿込橋	鹿込線	1973	6.3	3.4	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
423	大野町	井の元橋	井の元線	1920	13.6	5.3	鋼	H29	Ⅲ	R4	Ⅰ									○						
424	三重町	並木橋	並木線	1984	14.9	6.0	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7	Ⅱ			○										
425	大野町	古殿橋	ダリマ線	1817	8.1	4.8	石橋	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
426	大野町	下津留橋	下津留線	1978	17.6	4.7	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
427	朝地町	山田橋	城岳線	1991	12.5	10.1	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
428	朝地町	原の谷橋	原の谷線	1979	3.4	3.4	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
429	千歳町	鳥越橋	鳥越小原線	1979	4.1	4.4	RC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
430	千歳町	後大木橋	大木４号線	1979	4.0	4.3	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
431	大野町	ウソノ谷橋	北園線	1973	3.9	3.3	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
432	千歳町	御領橋	高畑細長線	1992	8.4	8.7	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
433	三重町	宮野橋	宮野線	1982	16.6	6.0	PC	H27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ			○										
434	大野町	三寺原跨道橋	代ノ原・鼓田線	2014	58.3	7.5	PC	H27	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
435	大野町	庄屋橋	大石線	1988	18.7	6.0	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
436	大野町	佐伯原橋	佐伯原線	1985	4.1	3.4	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
437	大野町	穴井橋	茜・今峠線	2004	32.8	6.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
438	千歳町	尾久保橋	下山片島線	2002	41.6	8.9	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
439	千歳町	漆生跨道橋	下山片島線	1997	36.4	8.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
440	大野町	鳥井平橋	鳥井平・千仏線線	2007	92.2	6.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
441	大野町	横枕橋	大溝・横枕線	1999	11.5	10.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
442	千歳町	平橋	漆生1号線	2010	25.4	7.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
443	大野町	中道橋	京津留線	－	12.4	4.8	鋼	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ									○						塗装塗替工等
444	大野町	栗の木橋	栗ノ木代三吾線線	－	4.4	4.6	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
445	大野町	梶屋橋	酒井寺線	1995	13.6	5.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
446	大野町	茜橋	茜今峠線	2004	24.2	4.3	石橋	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
447	犬飼町	新戸ノ口橋	戸ノ口・赤峰線	1985	22.6	6.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
448	大野町	界橋	茜・今峠線	－	3.0	10.3	BOX	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
449	犬飼町	戸ノ口橋	戸ノ口線	1954	6.6	3.6	RC	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ											○				ひび割れ補修工等
450	大野町	永田橋	街横枕線	1973	13.0	6.9	鋼	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ									○						
451	大野町	横街橋	永田線	1973	4.4	4.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
452	千歳町	八山橋	舟木田原園線	1973	12.1	6.2	PC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
453	大野町	門前橋	酒井寺北園線	2004	16.5	8.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
454	大野町	極楽橋	城の後線	1973	10.4	4.6	鋼	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ									○						
455	千歳町	新大千橋	舟木・田原園線	2004	32.0	6.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
456	千歳町	漆生橋	漆生2号線	1979	25.4	5.3	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
457	大野町	天道橋	天道線	1987	21.6	6.8	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
458	大野町	女小野橋	後田支線	2007	35.0	4.0	RC	H30	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
459	大野町	ふれあい橋	岡・中道線	2004	14.3	8.3	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
460	千歳町	太田橋	漆生1号線	1981	33.1	3.8	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
461	千歳町	横尾橋	漆生横尾線	1984	3.3	9.1	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
462	大野町	河屋橋	中原河屋支線	－	20.8	4.5	石橋	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
463	大野町	田中橋	田中街線	1959	17.0	7.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
464	大野町	新田中橋	街妙勝庵線	1982	13.7	6.7	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
465	大野町	千載橋	菅田十時線	1971	15.5	5.4	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
466	犬飼町	浜川橋	下山奥・深野線	1971	42.0	6.7	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
467	千歳町	新殿橋	新殿大木線	1987	37.0	5.5	PC	－	－	R5	Ⅱ											○				
468	大野町	姥橋	街・横枕線	1973	3.0	4.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
469	大野町	新河屋橋	中原河屋線	2002	33.0	8.3	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
470	大野町	新岡鶴橋	岡線	2003	28.0	6.3	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
471	大野町	岡鶴橋	下鶴線	1953	20.1	3.9	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
472	千歳町	柳平跨線橋	高畑細長線	1970	13.5	5.8	PC	－	－	R5	Ⅱ											○				
473	大野町	丸山橋	丸山線	－	10.2	4.2	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
474	大野町	稗田橋	酒井寺線	1972	7.8	6.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
475	朝地町	糸棚橋	田夫時線	1973	16.6	4.6	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ									○			△			ひび割れ補修工等
476	大野町	若宮第二橋	十時・酒井寺線	1989	13.8	7.7	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
477	犬飼町	山奥橋	下山奥深野線	2004	3.4	6.1	BOX	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
478	大野町	若宮橋	十時・酒井寺線	1987	15.0	7.5	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
479	千歳町	恵良之前橋	新殿長峰線	1984	36.3	5.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
480	千歳町	下原橋	新殿長峰線	1945	4.1	5.5	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
481	千歳町	新谷合橋	舟木１号線	2003	10.5	7.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
482	大野町	木原橋	不動様尾崎線	－	6.5	4.1	石橋	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
483	大野町	不動橋	田中勝光寺線	1973	4.2	4.4	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
484	千歳町	長峰橋	長峰2号線	1993	32.6	6.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
485	犬飼町	中央橋	鉢久保・長谷線	1996	11.2	9.5	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
486	犬飼町	大園橋	大園・上り口線	1982	16.5	3.8	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
487	犬飼町	初保尾橋	初保尾線	1999	22.5	8.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
488	大野町	山下橋	山下常忠寺線	1973	11.4	4.8	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
489	大野町	勝光寺橋	十時・酒井寺線	1990	11.3	8.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
490	大野町	平野寺橋	酒井寺・平岡線	1990	12.0	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録						点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去												補修内容（主な措置内容）
								1巡目		2巡目		3巡目		2024 R6		2025 R7		2026 R8		2027 R9		2028 R10		2029 R11		
								点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検実施年度	判定区分	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	点検	対策	
491	大野町	平岡橋	平岡線	1973	7.2	4.6	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
492	千歳町	岩下橋	大迫長峰線	1941	4.0	3.2	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
493	犬飼町	太朗丸橋	石井線	1962	4.9	6.6	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
494	千歳町	野尻橋	柴山大迫線	1989	33.8	8.0	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
495	千歳町	楠跨道橋	ウソノヲ線	2006	47.3	6.0	PC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
496	千歳町	北平橋	北平線	1990	4.4	5.2	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
497	大野町	藤浪橋	田中藤浪線	－	6.7	4.7	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
498	大野町	坪井橋	坪井線	1989	12.0	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
499	犬飼町	石井橋	上重・石井線	1972	35.0	5.8	鋼	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ											○	●		●	塗装塗替工等
500	大野町	岡倉橋	平岡支線	－	3.4	3.7	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
501	大野町	駆速橋	藤浪・平岡線	1990	10.4	4.7	鋼	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
502	大野町	折戸橋	折戸・宮本線	1982	7.7	4.1	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
503	大野町	宮原橋	西風寺線	－	2.3	6.2	BOX	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
504	大野町	常忠寺２号橋	十時・酒井寺線	1988	9.2	7.6	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
505	千歳町	高添第5跨道橋	石五道線	2004	44.0	6.0	PC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
506	大野町	車橋	浅ヶ迫線	－	8.8	4.8	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
507	千歳町	久保山１号橋	久保山２号線	1982	3.5	3.4	RC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
508	犬飼町	新通山橋	吐合山奥１号線	2003	17.3	8.9	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
509	犬飼町	通山橋	長谷・吐合線	1959	5.0	4.6	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
510	千歳町	久保山２号橋	久保山２号線	1991	3.3	2.3	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
511	大野町	藤北橋	十時・酒井寺線	1985	12.0	7.5	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
512	犬飼町	椚尾橋	新道・石井線	1995	14.5	8.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
513	大野町	小切畑橋	小切畑線	－	7.8	6.7	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
514	大野町	府手橋	府手線	－	7.0	4.1	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
515	犬飼町	上重橋	津留・上重線	1957	3.0	4.0	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
516	犬飼町	戸上橋	吐合・戸上線	1965	14.2	4.6	RC	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ							●			●	○				ひび割れ補修工等
517	大野町	横田橋	横田線	－	5.0	3.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
518	犬飼町	船木橋	吐合・戸上線	1965	21.1	4.6	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
519	犬飼町	井ノ谷橋	葛川線	1956	5.0	4.0	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
520	犬飼町	井平ノ谷橋	樋ノ口・葛川線	1973	7.1	5.4	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
521	犬飼町	高松橋	津留・高松線	1951	125.0	3.3	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ											○				ひび割れ補修工等
522	千歳町	高添第2跨道橋	下ノ原２号線	2004	42.0	6.0	PC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
523	大野町	オノ橋	上畑・小野線	1973	11.4	5.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
524	犬飼町	広瀬橋	名本・高添線	1989	38.8	5.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
525	朝地町	河内橋	河内線	1932	10.6	5.6	RC	R1	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
526	大野町	つるぞい橋	菅田十時線	－	9.4	4.9	石橋	H29	Ⅲ	R4	Ⅰ									○						
527	千歳町	両村橋	石田1号線	1999	43.0	8.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
528	犬飼町	両村橋(旧橋)	柴北石田線	1939	28.4	4.2	石橋	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
529	犬飼町	山下橋	島・山下線	1980	7.7	3.6	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
530	犬飼町	長畑橋	新飼・中井田線	1971	20.0	5.8	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
531	犬飼町	寺田橋	市・葛川線	1991	30.8	6.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
532	犬飼町	津ヶ無礼橋	柳瀬・津ヶ無礼線	1954	32.7	2.0	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ											○				ひび割れ補修工等
533	犬飼町	千束橋	天ヶ瀬・田口線	1985	30.0	5.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
534	犬飼町	神宿橋	神宿線	1921	27.0	3.7	石橋	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
535	朝地町	神角寺橋	神角寺線	1977	11.5	7.3	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
536	千歳町	下ノ原跨道橋	下ノ原２号線	2007	36.5	6.0	PC	H30	Ⅰ	R5	Ⅰ											○				
537	犬飼町	新岩屋橋	岩屋線	1985	28.0	4.8	PC	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ								●		●	○				ひび割れ補修工等
538	犬飼町	上重（第２号）橋	津留・上重・石井線	1957	3.2	4.0	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
539	犬飼町	樋口橋	樋ノ口・葛川線	1974	30.5	5.8	PC	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ											○				
540	大野町	農免河面橋	小切畑河面線	1990	29.0	6.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
541	犬飼町	竹ノ下橋	落合・竹ノ下線	1988	19.0	5.0	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
542	犬飼町	丸田橋	柳瀬・釘野線	1961	2.2	3.9	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
543	犬飼町	吐合大橋	吐合山奥２号線	2003	153.9	9.5	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
544	犬飼町	山内橋	落合・山内線	1973	6.6	4.7	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
545	犬飼町	比モウセ橋	真萱線	－	3.0	2.4	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
546	犬飼町	吐合橋	吐合・戸上線	1991	58.0	9.5	鋼	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ											○				塗装塗替工等
547	犬飼町	西谷橋	柴北高津原線	－	3.4	7.0	BOX	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
548	犬飼町	福門橋	横町線	1919	40.0	5.2	石橋	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
549	大野町	花の木橋	花の木線	－	9.5	4.7	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
550	犬飼町	犬飼中央橋	新道・石井線	1997	30.0	9.3	鋼	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ								●		●	○				塗装塗替工等
551	朝地町	中無田橋	神温線	1960	4.8	4.0	RC	H30	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
552	犬飼町	小野橋	新飼･葛川線	1955	39.2	3.0	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ											○				ひび割れ補修工等
553	犬飼町	上ワ町跨道橋	上ヘ村下の原線	2005	56.7	6.1	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
554	犬飼町	新小野橋	小野線	1998	40.0	6.7	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
555	犬飼町	恵良橋	新飼・柚河内線	1981	2.3	3.6	BOX	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
556	犬飼町	花香橋	横手・山内線	1973	17.7	5.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
557	犬飼町	真萱橋	真萱・落ル水線	1964	18.3	3.4	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
558	犬飼町	鮎ヶ瀬橋	上ヘ村線	1948	25.0	4.0	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ											○				ひび割れ補修工等
559	大野町	第二岩杉橋	岩杉光昌寺線	1975	23.9	6.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
560	犬飼町	折立橋	折立・栗ノ木線	－	8.5	3.6	石橋	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				

豊後大野市橋梁修繕計画（個別施設計画）

番号	地区名	橋梁名	路線名	架設年	橋長(m)	幅員(m)	橋種	点検記録 1巡目 点検実施年度	1巡目 判定区分	2巡目 点検実施年度	2巡目 判定区分	3巡目 点検実施年度	3巡目 判定区分	点検・対策実施計画 ○:点検 △:修繕設計 ●:修繕工事 ■:更新 ×:撤去 2024 R6 点検	2024 R6 対策	2025 R7 点検	2025 R7 対策	2026 R8 点検	2026 R8 対策	2027 R9 点検	2027 R9 対策	2028 R10 点検	2028 R10 対策	2029 R11 点検	2029 R11 対策	補修内容（主な措置内容）
561	犬飼町	新河内橋	天神町･宇津尾木綿線	1971	34.0	4.6	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
562	大野町	第一岩杉橋	岩杉・光昌寺支線	1929	12.4	3.8	石橋	H29	Ⅱ	R4	Ⅰ									○						
563	犬飼町	寒須橋	柳瀬・釘野線	1973	20.0	5.8	鋼	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ										●	○	●			塗装塗替工等
564	朝地町	三成橋	温見三成線	－	8.4	3.9	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
565	犬飼町	柚川内橋	新飼・柚河内線	1992	7.5	4.7	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
566	犬飼町	栗ノ木橋	柳瀬・釘野線	1988	7.5	11.1	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
567	朝地町	舟川橋	芹川線	1996	70.0	8.2	鋼	H29	Ⅰ	R4	Ⅱ									○						
568	犬飼町	内河跨道橋	内河線	2005	48.5	9.2	PC	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ											○				
569	犬飼町	屋永橋	久原・屋永線	1988	7.0	4.2	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
570	犬飼町	塚田橋	塚田線	－	2.1	5.9	BOX	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
571	朝地町	ささご橋	引地原線	1998	26.8	5.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
572	犬飼町	阿原橋	阿原線	1973	10.4	4.9	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
573	犬飼町	田ノ平橋	柴北・伊予床線	1996	29.5	8.2	PC	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ											○				
574	緒方町	小迫橋	馬背畑六種線	1989	21.7	6.2	PC	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ						○									
575	犬飼町	下野跨道橋	下津尾・野首線	1995	36.2	11.0	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
576	朝地町	小川野２号橋	小川野線	1960	5.4	3.9	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
577	犬飼町	宇津尾木橋	天神町・宇津尾木線	1959	9.0	5.1	RC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
578	大野町	第一西川橋	西川線	－	13.0	6.3	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
579	大野町	第二西川橋	西川線	1933	5.0	4.9	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
580	朝地町	小川野橋	小川野中央線線	1975	10.6	4.5	RC	R2	Ⅲ	R4	Ⅲ									○						ひび割れ補修工等
581	大野町	地吉橋	木浦内線	1979	6.0	4.2	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
582	大野町	吉原橋	木浦内線	1979	9.9	6.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
583	大野町	杉野橋	木浦内線	1979	5.6	6.8	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
584	犬飼町	伊予床橋	柴北・伊予床線	2001	21.0	8.2	PC	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ											○				
585	大野町	下田橋	下田線	－	11.8	3.0	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
586	大野町	安藤橋	薮田・向田線	1963	5.0	5.5	RC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
587	大野町	第一安藤橋	安藤線	1971	13.0	4.2	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
588	大野町	庵の前橋	田附線	－	14.0	5.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
589	大野町	寺窪橋	田附線	－	13.0	7.1	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						
590	大野町	小組橋	小組線	1988	10.0	4.0	PC	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ									○						

年次計画

優先順位	諸元				健全度	概算工事費	設計	対策実施計画 ○:設計 ●:修繕工事 ■:更新						計画
	橋梁名	架設年	橋長（m）	上部工構造形式				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	
1	（下部工） 中津無礼橋(上部工) （撤去）	1965	35.70	RC橋	Ⅳ	¥147,000,000	済	■						R5設計
						¥150,000,000	済		■					R5設計
						¥150,000,000	済			■				R6設計
2	柳瀬橋	1964	27.00	PC橋	Ⅲ	¥370,000,000	済	■	■	■	■	■		H24設計、改良事業
3	下田橋	1966	17.00	鋼橋	Ⅲ	¥61,000,000	済	●						R3設計・R6工事
4	大恩寺陸橋	1970	20.50	鋼橋	Ⅲ	¥20,000,000	済		●					R3設計・R7工事
5	下中田橋	1978	28.60	PC橋	Ⅲ	¥7,600,000	済		●					R4設計・R7工事
6	長谷橋	1958	4.10	RC橋	Ⅲ	¥850,000	済		●					R4設計・R7工事
7	受川橋	1953	25.00	RC橋	Ⅲ	¥500,000	済		●					R5設計・R7工事
8	井崎橋	1979	35.00	鋼橋	Ⅲ	¥30,000,000	-			○	●	●		
9	中渡橋	1997	20.40	PC橋	Ⅲ	¥20,732,000	-				○	●	●	
10	一ツ橋	1930	16.50	RC橋	Ⅲ	¥18,163,708	済			●	●			R1補修設計
11	新岩屋橋	1985	28.00	PC橋	Ⅲ	¥18,132,525	済			●	●			R1補修設計
12	犬飼中央橋	1997	30.00	鋼橋	Ⅲ	¥19,476,976	済			●	●			R2補修設計
13	戸上橋	1965	14.20	RC橋	Ⅲ	¥8,692,200	済			●	●			R1補修設計
14	権現橋	1960	22.50	鋼橋	Ⅲ	¥45,000,000	済				●	●		R1補修設計
15	寒須橋	1973	20.00	鋼橋	Ⅲ	¥42,000,000	済				●	●		R2補修設計
16	高橋	1975	10.50	RC橋	Ⅲ	¥15,000,000	済				●	●		R2補修設計
17	妙見橋	1953	55.60	RC橋	Ⅲ	¥35,888,600	済					●	●	R3補修設計
18	久原陸橋	1980	29.00	鋼橋	Ⅲ	¥20,233,046	済					●	●	R3補修設計
19	石井橋	1972	35.00	鋼橋	Ⅲ	¥45,283,700	済					●	●	R3補修設計
20	池田橋	1981	19.65	PC橋	Ⅲ	¥17,048,816	済					●	●	R3補修設計
21	折立橋	1973	7.30	RC橋	Ⅲ	¥4,717,070	済					●	●	R3補修設計
22	宮尾中央橋	1984	13.00	PC橋	Ⅲ	¥21,546,800	済						●	R3補修設計
23	宮下橋	1951	9.30	RC橋	Ⅲ	¥3,230,700	済						●	R4補修設計
24	板屋橋	1962	22.20	RC橋	Ⅲ	¥15,825,700	済						●	R4補修設計
25	原の水橋	1980	45.90	鋼橋	Ⅲ	¥60,566,000	済						●	R4補修設計
26	増氏橋	1955	30.12	RC橋	Ⅲ	¥12,772,100	済						●	R4補修設計
27	大野橋	1975	15.00	鋼橋	Ⅲ	¥16,707,900	済						●	R4補修設計
28	下鷲谷橋	1968	21.10	RC橋	Ⅲ	¥8,600,900	済						●	R4補修設計
29	山ノ神橋	1965	17.10	RC橋	Ⅲ	¥12,030,700	済						●	R4補修設計
30	観音橋	1982	19.70	PC橋	Ⅲ	¥14,732,578	済						●	R4補修設計
31	出合橋	1932	18.70	RC橋	Ⅲ	¥5,878,400	済						●	R4補修設計
32	大門瀬橋	1962	25.20	RC橋	Ⅲ	¥21,490,700	済						●	R4補修設計
33	広瀬橋	1995	17.20	PC橋	Ⅲ	¥11,720,500	済						●	R4補修設計
34	黒田橋	1967	8.00	RC橋	Ⅲ	¥7,568,000	済							R4補修設計
35	赤道橋	1961	5.20	RC橋	Ⅲ	¥3,587,100	済							R4補修設計
36	和田鶴橋	1969	33.00	PC橋	Ⅲ	¥13,000,000	済							R5補修設計
37	御渡橋	1979	6.20	RC橋	Ⅲ	¥6,385,000	済							R5補修設計
38	小宛中央1号橋	1973	4.50	RC橋	Ⅲ	¥3,758,700	済							R5補修設計
39	中道橋	1973	12.40	鋼橋	Ⅲ	¥15,108,500	済							R5補修設計
40	戸ノ口橋	1954	6.60	RC橋	Ⅲ	¥1,287,000	済							R5補修設計
41	小川野橋	1975	10.40	RC橋	Ⅲ	¥10,525,089	済							R5補修設計
42	本谷橋	1963	15.40	RC橋	Ⅲ	¥30,386,393	済							R1補修設計
43	牧橋	1931	62.30	RC橋	Ⅲ	¥183,874,000	済							R3補修設計
44	瀬口橋	1972	16.00	鋼橋	Ⅲ	¥14,491,000	済		○					R7補修設計
45	高屋4号橋	1978	5.00	RC橋	Ⅲ	¥10,711,000	済		○					R7補修設計
46	糸棚橋	1973	16.60	RC橋	Ⅲ	¥36,350,000	-					○		
47	烏帽子橋	1951	20.73	RC橋	Ⅲ	¥38,091,000	-						○	
48	小野橋	1955	38.80	RC橋	Ⅲ	¥55,411,000	-							
49	吐合橋	1991	9.50	鋼橋	Ⅲ	¥94,157,000	-							
50	小河内橋	1972	13.40	鋼橋	Ⅲ	¥10,762,000	-							
51	野間橋	1956	7.10	RC橋	Ⅲ	¥12,843,000	-							
52	高松橋	1951	125.00	RC橋	Ⅲ		-							沈み橋
53	津ヶ無礼橋	1954	32.70	RC橋	Ⅲ		-							沈み橋
54	鮎ヶ瀬橋	1948	25.00	RC橋	Ⅲ		-							沈み橋
